




Warszawa, 25.11.2010r.

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

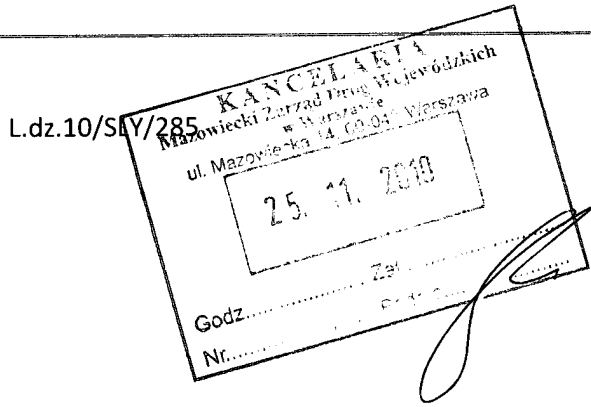

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 - na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 – skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim,

W związku z zaistniałym, wciąż powiększającym się opóźnieniem wynikającym z nieznanym nam działanym podejmowanym przez organ zatwierdzający projekty organizacji ruchu, niniejszym przekazujemy protokołem z dnia 25.11.2010r opracowany i zaopiniowany projekt stałej organizacji ruchu w wersji elektronicznej – zgodnie z SIWZ prośbą o dokonanie odbioru częściowego.

W dniu 07.07.2010r wystąpiliśmy do właściwego organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (pismo nr 10/SLY/151 z dnia 06.07.2010 z kompletem opinii) z prośbą o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla w/w zadania.

W dniu 30.07.2010 pismem nr NI.D.I/PT/5418-338/10 z dnia 26.07.2010 Marszałek Woj. Mazowieckiego odesłał projekt celem wprowadzenia poprawek wskazując uwagi zawarte w opinii MZDW w Warszawie. Po przeanalizowaniu wskazanych w piśmie Marszałka uwag stwierdzić należy, iż złożony przez nas wcześniej do zatwierdzenia projekt (w dniu 07.07.2010) uwzględnił już te uwagi, co świadczy o fakcie, iż projekt został bezpodstawnie odesłany, bez sprawdzenia i wskazuje na postępowanie organu mające na celu odwołanie czynności, do których jest zobowiązany.

W dniu 20.08.2010 pismem nr 10/SLY/188 z dnia 19.08.2010r ponownie wystąpiliśmy do Marszałka Woj. Mazowieckiego z prośbą o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, odnosząc się w punktach do każdej uwagi wymienionej w piśmie z dnia 26.07.2010. Uwzględniliśmy również nader istotną uwagę organu mającą na celu wymianę załączonego planu orientacyjnego na, tu cyt: „...w odpowiedniej skali”.

Informujemy, iż do dnia dzisiejszego (97 dni), pomimo wielokrotnych prośb, interwencji i telefonicznych ponaglań osoby prowadzącej temat, nie otrzymaliśmy zatwierdzenia złożonej dokumentacji projektowej ani też jakiegokolwiek pisma w sprawie.

Z uwagi na fakt, iż Zleceniodawca realizowanego przez nas zamówienia, jakim jest MZDW w Warszawie działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Inwestora przedsięwzięcia, jakim jest Marszałek Województwa Mazowieckiego stwierdzić należy, iż to Zamawiający pozostaje w niczym nieusprawiedliwionej zwłoce dotyczącej realizacji w/w umowy uniemożliwiającej nam, jako Wykonawcy terminowe przekazywanie poszczególnych elementów dokumentacji pro-



jektowej, a tym samym realizację samego zamówienia, narażając naszą firmę na wymierne straty finansowe.

Z uwagi na zaistniałą sytuację i bliżej nieokreślony termin wywiązania się Urzędu Marszałkowskiego z czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami przekazujemy w dniu dzisiejszym wszystkie elementy dokumentacji projektowej wynikające z SIWZ (pkt. 3.2.12 oraz 1.2.13-1.2.15), a umożliwiające rozliczenie częściowe – zgodnie z otrzymanym od Państwa pismem nr I-1/2220-1541/10/631.416.09 z dnia 13.09.2010.

Podsumowując informujemy, iż za zaistniałe prawie 3 –miesięczne opóźnienie w przekazaniu tej części dokumentacji odpowiedzialny jest organ zatwierdzający projekt stałej organizacji ruchu (o czym informowaliśmy Państwa w składanych co miesięcznych raportach).

BYEKTOR
inż. Sylwester Biały

Załączniki:

- 1) Pismo SLY PROJEKT nr 10/SLY/151 z dnia 06.07.2010
- 2) Pismo UM nr NI.D.I/PT/5418-338/10 z dnia 26.07.2010
- 3) Pismo SLY PROJEKT nr 10/SLY/188 z dnia 19.08.2010r
